

Opasteasennukset aloitettu

Toimintakoesiivoukset ovat valmistuneet koko rakennuksen alueelta. Ensi viikolla aloitamme loppusiivoustyöt kolmannesta kerroksesta. Sisäpuolen viimeistelytyöt ovat käynnissä koko rakennuksen alueella.


Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen koekäyttöjen ja säätötöiden merkeissä.

Tällä viikolla alkaneita töitä ovat oviopasteiden asennukset sekä pääsisäänkäynnin edustan pihakiviasennukset.


Arkkitehdit vierailivat työmaalla alkuviikosta. Käynnissä ovat myös käyttäjien kierrokset. Ensi viikolla aloitetaan käytönopastukset eri käyttäjäryhmien kanssa.

Pihalla jatkuvat liikenneväylien, aitalinjojen ja pihavarusteiden maarakennustyöt. Pääsisäänkäynnin edustan pihakiviasennukset jatkuvat ensi viikolla. Opettajien pyöräkatoksen pohjatytöt ovat valmistuneet ja ensi viikolla valetaan katoksen laatta.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,31 %. Työmaalla on työskennelty 690 päivää tapaturmitta.

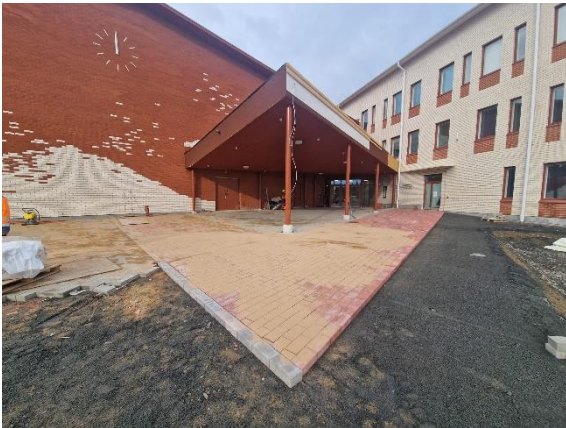

Kuva Pääsisäänkäynnin edustan pihatöitä

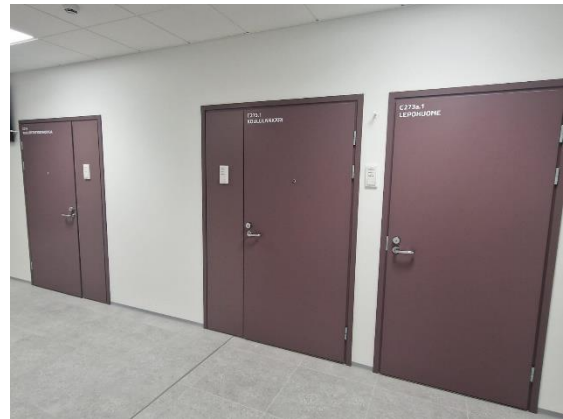

Kuva C-lohkon opasteasennuksia



Kuva B-lohkon kolmannen kerroksen käytävää



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
