

Julkisivuopasteen asennus aloitettu

A- ja B lohkojen toisessa ja kolmannessa kerroksessa toimintakoesiivoukset sekä varusteasennukset jatkuvat myös tällä viikolla. Noilla alueilla suoritetaan itselle luovutuksia. Molempien lohkojen IV- konehuoneiden toimintakoesiivoukset ovat päättyneet. A-lohkon katolla valmistellaan aurinkopaneelien asennuksia. A-lohkon rappukäytävän alakattotyöt ovat valmistuneet, tuolla aloitettu käsijohdeasennukset. Pääportaikon alakattotyöt jatkuvat. B-lohkon rappukäytävässä valmistellaan ensi viikolla alkavia alakattotöitä.

C-lohkon ensimmäisessä kerroksessa kipsialakattotyöt ovat pääosin valmistuneet. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat ensimmäisessä kerroksessa. Toisen kerroksen oviaasennukset saatettiin valmiiksi, tuolla työt jatkuvat listoituksin. C-lohkon rappukäytävässä suoritettu käsijohdeasennuksia. Pääsisäänkäyntikatokseen tulevan julkisivuopasteen asennustyöt käynnistyivät tällä viikolla. Liikuntasalissa aloitettiin kääntökatsomoiden asennustyöt sekä jatkettiin muita varusteasennuksia.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,85. Työmaalla on työskennelty 653 päivää tapaturmitta.


Työmaan toivottaa mukavaa pääsiäistä kaikille!



Kuva 3. kerroksen lokerikot.



Kuva C-lohkon käsijohdeasennukset.

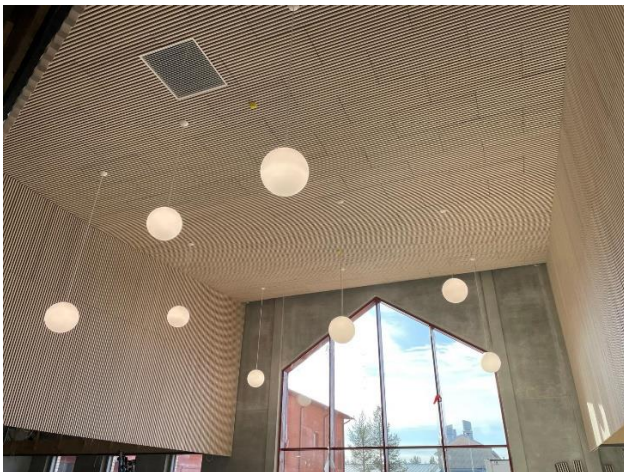

Kuva Ruokalan valaisimissa valot.



Kuva A-lohkon porraskäytävä



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Elisa Salmela

elisa.salmela@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
