

Napsun suunnittelupäivässä työskenneltiin arvojen äärellä

Työmaan A-lohkolla ensimmäisen kerroksen väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Vesikattoelementtien asennus on aloitettu A-lohkolle.

B-lohkon betonielementti asennukset ovat valmistuneet ja AKO-väliseinämuuraukset jatkuvat. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen lattian valut alkavat.

C-lohkon väestönsuojan valutyöt ovat käynnissä. Anturoiden sekä maanpaineseinien muotti, rauditus ja valutyöt jatkuvat.


Vesikattoelementtien asennus jatkuu A-osalla sekä alkaa B-lohkolla viikolla 10. B-osalla lattiavalut jatkuvat.

Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusalalle kuuluvan TR mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. työmaan putoamissuojausten tarkastelua ja järjestystä sekä jätehuoltoa. Viikon kahdeksan tulokseksi on mitattu 97,0,2 % ja työmaalla on työskennelty 241 päivää tapaturmitta.

Monitoimitalon henkilökunta kokoontui 28.2.2024 Nivavaaran koululle arvokeskusteluun. Yhdessä pohdimme Rovaniemen kaupungin arvoja ja niiden merkitystä työyhteisössä. Arvokeskustelu jatkuu 24.4.2024 suunnitteluiltapäivässä Napsun monitoimitalon arvojen äärellä. Kiitos kaikille antoisasta iltapäivästä!



Kuva A-lohkon vesikattoelementtien asennus

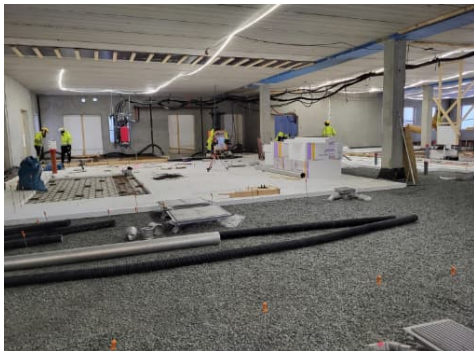

Kuva B -lohkon lattian eristys ja rauditus



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
