

TYÖMAATIEDOTE VKO 50-51 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



21.12.2018

### TEHDYT TYÖT

- L-talon 1.krs elementit asennettu
- L-talon 1.krs holvin talotekniikka asennetut
- L-talon 1.krs holvin raudoitustyöt tehty
- L-talon 1.krs holvi valettu
- M-talon sokkelit asennettu




*L-talon seinäelementit asennettu ja holvin muottityöt käynnissä*

TYÖMAATIEDOTE VKO 50-51 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

- L-talon 2.krs paikallavaluseinät

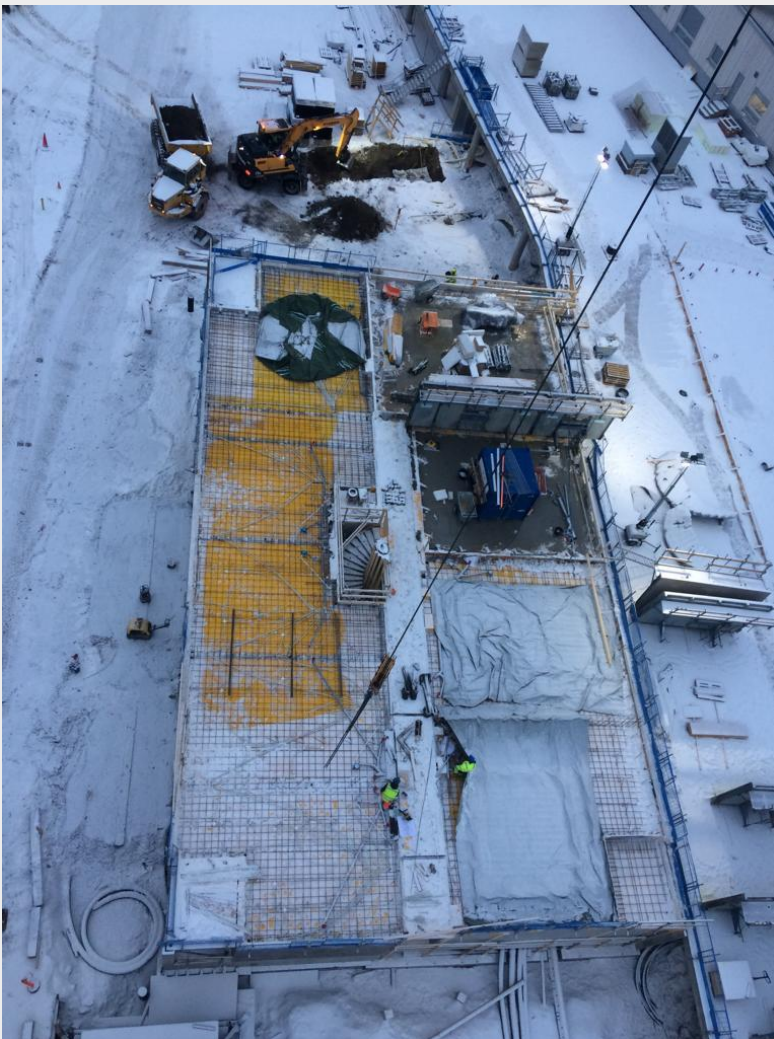

*L-talon holvin raudoitus- ja talotekniikka-asennukset käynnissä*

TYÖMAATIEDOTE VKO 50-51 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### SEURAAVAN VIIKON TYÖT

Työmaa pääosin suljettu viikolla 52. Viikolla 1 alkavia töitä

- M-talon ontelolaatta asennus
- L-talon 2.krs paikallavaluseinät

Viikolla 2 aloitetaan 2.krs seinäelementtiasennus

### TYÖTURVALLISUUS

Viikon 51 TR-turvallisuusmittauksen tulos oli ulkopuolisessa mittauksessa 99,3 %. Työmaalla on työskennelty 84 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita.

### TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskevista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen [janne.virtanen@ncc.fi](mailto:janne.virtanen@ncc.fi).

Ystävällisin terveisin  
**NCC Building**

Janne Virtanen
