


Viikkotiedote 35/2026



Kansallisarkiston peruskorjaustyömaalla kesä on vähitellen vaihtumassa alkusyksyyn. Sääolosuhteet ovat olleet rakennustöiden kannalta suotuisat, ja sateita on esiintynyt vain vähän. Kesälomakausi on päättymässä, ja valtaosa henkilöstöstä on jo palannut työmaalle.

Kesän aikana julkisivutelineiden asennukset on saatu valmiiksi. A- ja B-makasiinit sekä Uusi tutkijasali on suojattu sääsuojilla, jotka mahdollistavat työskentelyn sääolosuhteista riippumatta. Sääsuojien valmistuttua julkisivut ja vesikatot on dokumentoitu huolellisesti ennen varsinaisten korjaustöiden käynnistymistä. Dokumentointivaiheen jälkeen julkisivujen purkutyöt on voitu aloittaa suunnitellusti.

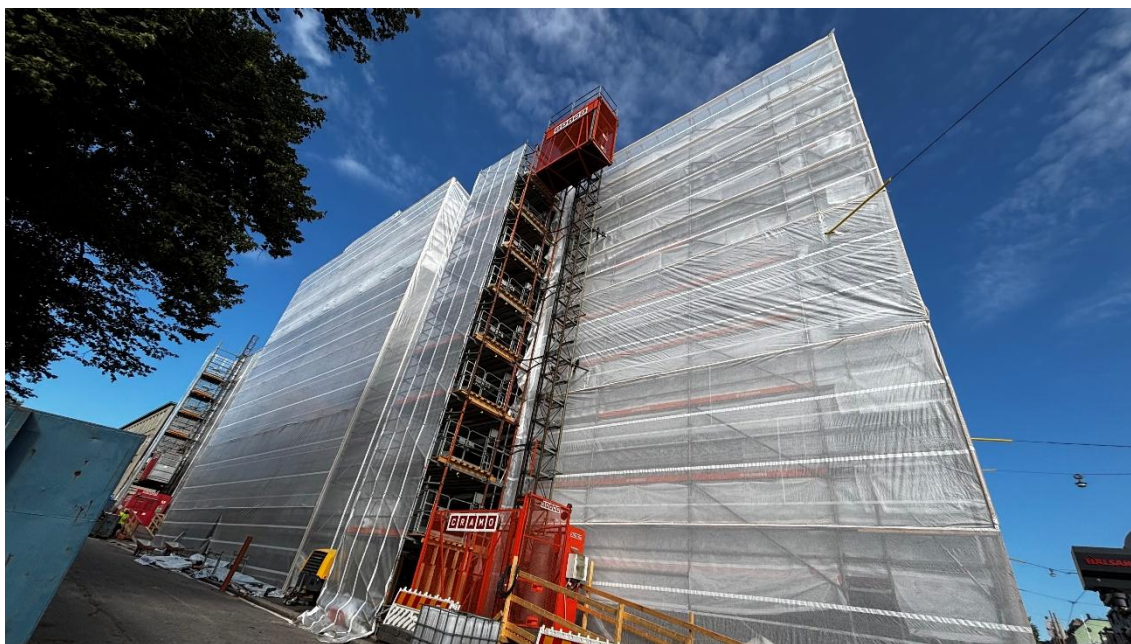

Kuva 1. Sääsuoja Uuden tutkijasalin yllä.



Kuva 2. Sääsuoja Snellmaninkadulla.

Tiedotusvälillä tapahtunut ja käynnissä olevat työvaiheet

- talotekniikkareittien varmistaminen ja rakennus
- timanttityöt ja läpiviennit
- mallihuoneiden rakennus- ja viimeistely
- sisäpuolen purkutyöt
- rusnaukset pohjakerroksessa valmiit
- hissikuilujen purut ja purkujen valmistelu
- IV-konehuoneiden rakennustöiden valmistelu
- talotekniikkakuilujen ja nousureittien valmistelu tuleville LVIA- ja sähköasennuksille
- lämmitysjärjestelmän rakentaminen ja työmaaolosuhteiden hallinta
- kunnostettavien ikkunoiden dokumentointi
- julkisivun purkutyöt ja haalausaukkojen avaukset
- julkisivun kipsikoristeiden dokumentointi ja irrotus
- julkisivun rappaus- ja maalausmallit
- teline ja sääsuojatyöt valmiit
- konservointi
- työmaan valaistus ja varustelu

Alkavat työvaiheet

- vesikattotöiden käynnistäminen
- tiivistystyöt



Kansallisarkiston kellarikerroksessa rusnaustyöt ovat valmistuneet. Kallioseinämistä irronneet suuremmat kivet poistetaan rakennuksesta kottikärryillä ja hissillä, kun taas pienempi kiviaines kuljetetaan pois imuautolla. Nyt kun kallioseinien turvallisuus on varmistettu, voidaan vanhojen salaojien päällä olevien maa-ainesten poisto aloittaa. Rakennuksen ympärille rakennetaan uudet salaojat. Kellarikerroksessa uusitaan myös ilmanvaihtokoneita. Ennen uusien laitteiden asentamista vanhat ilmanvaihtokoneet puretaan osiin ja kuljetetaan pois rakennuksesta.



Kuva 3. Rusnauksia kellarikerroksessa.



Kuva 4. Poistettavia ilmanvaihtokoneita.

Rakennuksen sisäpuoliset purkutyöt ovat edenneet suunnitellusti ja ovat jo hyvässä vauhdissa. Puretuista tiloista raivattu purkujäte lajitellaan huolellisesti ennen sen toimittamista asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.



Kuva 5–6. Tiloja, joissa purkutyöt valmiit.



Lisätietoja:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>
