

Viikkotiedote 28–29




Vaikka alkukesä on ollut sateinen ja viileä, Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla työt ovat edenneet suunnitellusti ja täydellä teholla. Viikolla 29 Helsinkiin saapunut helleaalto on kuitenkin koetellut työntekijöiden jaksamista, erityisesti sääsuojan alla vallitsevan kuumuuden vuoksi. Työmaalla työskentelee yhä yhtä paljon henkilöstöä kuin talvella, vaikka kesälomakausi on nyt vilkkaimmillaan.




Kuva 2. Turelli Kansantieteellisen osan itälappeella.

Julkisivujen täyttörappaukset ovat edenneet Kansantieteellisen ja arkeologisen osan länsijulkisivuille. Liuskekivikatoilla kivipaanujen ladonta on käynnissä sekä suurilla kattolappeilla että torneissa. Peltitoissa on aloitettu Arkeologisen osaston pohjoislapeen kuparipellitys sekä Halkopihan pellitykset.

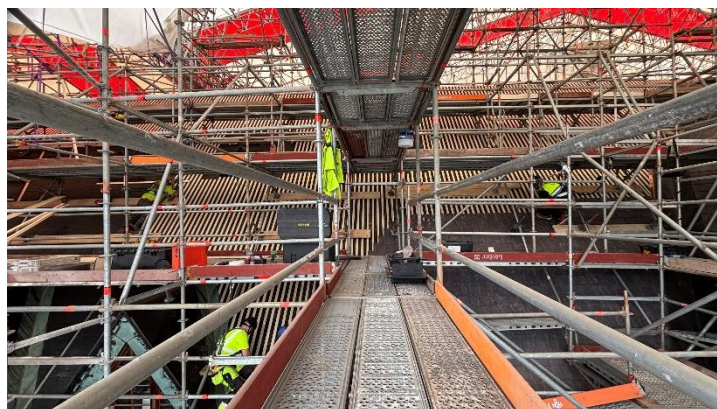

Kuva 1. Kattotyöt käynnissä Arkeologisen osan etälappeella.

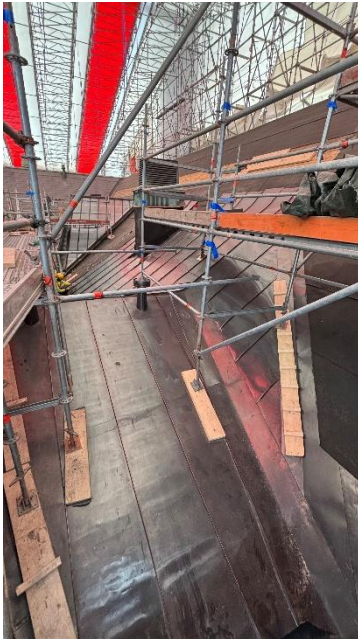

Kuva 3. Pellityksiä Arkeologisen osaston pohjoislappeella.



Kuva 4. Pellityksiä ja kermityksiä.



Kuva 5. Halkopihan sokkelin saumojen kittausta.


Halkopihalla on tehty sokkelin vedeneristystä, ja ensimmäinen vedenpaineekoe on suoritettu onnistuneesti. Räystäsrakenteisiin on asennettu lämmityskaapelit.

Vaunuvajan alueella kaivuutyöt jatkuvat edelleen. Osa sokkelin betonoinnista on valmistunut, minkä jälkeen aloitettiin vedeneristystyöt. Aitamuurien kunnostus- ja rappaustyöt etenevät suunnitellusti.

Sisäpuolella akustopinnoitteiset alakatot ovat valmiit. Urakkaan kuuluvat seinien maalaukset on pääosin tehty, mutta joitakin maalauksia jatketaan vielä syksyllä. Valaisinasennukset ja kalustustyöt ovat käynnissä, ja turvavaloja vaihdetaan. Heinäkuussa on aloitettu myös vanhojen, kunnostettujen listojen paikoilleen asennus.




Kuva 6. Maalaustöitä pohjakerroksessa.

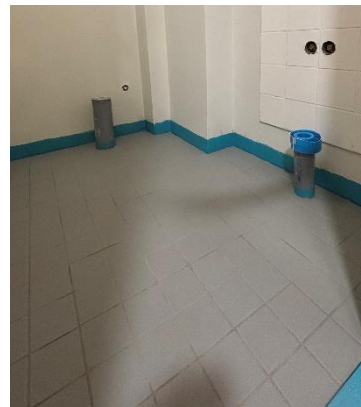

Kuva 7. Laatoitusta.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus, viimeinen erä kiviä saapunut Walesista
- julkisivurappaus
- julkisivun graniittiseinien kunnostus
- aluskerman- ja uusien peltien asennus
- LVI-työt, Halkopihan IV-koneen asennus ja lämmönjakokeskuksen vaihto
- sähkötyöt, sähkökalustus ja valaisinasennus
- ikkunakunnostus
- ovikunnostus
- listoitus
- konvektorinpenkkien asennus valmis
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä pääosin valmiit
- laatoitus valmis
- Halkopihan lasikaton teräsristikon viimeistely ja ympäröivien rakenteiden rakentaminen
- Maanrakennus, sokkelin betonointi ja muurien korjaus Vaunuvajalla
- Rakennushissin purku pohjoispäädyssä

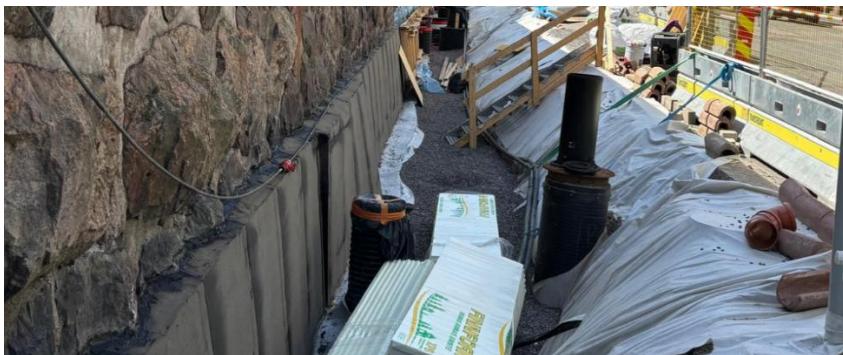

Kuva 8. Vaunuvajan sokkelitöitä.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232, lomalla viikko 28–32. Työmaasta vastaa Aleksi Ropponen, aleksi.ropponen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki
