

Viikkotiedote 22–23



Halkopihaksi kutsutaan Kansallismuseon sisäpihaa, joka muutetaan peruskorjauksen yhteydessä sisätilaksi lasikaton avulla. Viime viikolla valmistauduttiin lasikatteen teräsrunkojen nostoihin purkamalla yksi sääsuojaristikko ja poistamalla sen päällä ollut pressu. Tilalle asennettiin väliaikainen pressu, joka voidaan avata aina nostojen ajaksi.

Teräsrunko tuodaan työmaalle rekkojen kyydissä kahdeksassa osassa. Osat nostetaan sisäpihalle avatun sääsuojan kautta ja asetetaan Halkopihan sokkelin päälle. Paikan päällä teräsristikot siirretään lopullisille paikoilleen käsin, erillisen rullapöydän avulla. Tavoitteena on saada kaikki ristikkonostot valmiiksi ensi viikon aikana.




Kuva 1. Nosto käynnissä.



Kuva 2. Ristikko nostettu rullien päälle.



Kuva 3. Ristikon siirtoa oikealle paikalle.

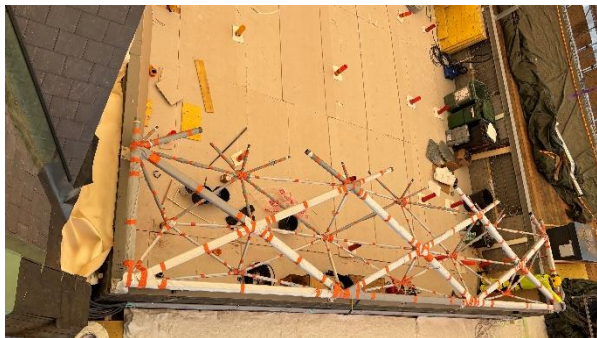

Kuva 4. Ensimmäinen ristikko paikoillaan.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus
- julkisivurappaus
- julkisivun graniittiseinien kunnostus
- aluskerman- ja uusien peltien asennus
- vesikaton korjaukset
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, palopeltien vaihto, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt, konehuoneiden asennustyöt, sähkökalustus ja valaisinasennus
- alakattotyöt
- ikkunakunnostus
- ovikunnostus
- konvektorinpenkkien asennus
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä
- mattotyöt valmiit
- laatoitus
- Halkopihan teräsristikon nostot
- Halkopihan akustorappausmallit
- Maanrakennustyöt



Kuva 5. Tartuntarappauksia Virastosiiven länsipuolella.



Kuva 6. Liuskekivien asennusta Virastosiiven porrashuoneessa.


NCC: n jokavuotista työturvallisuusviikkoa vietetään tiedottamaan ja sitouttamaan henkilöstöä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla keskiviikkoamu alkoi aamutreenillä. Yhteinen keppijumppahetki lisää henkilöstön hyvinvointia ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.

Suomen Kansallismuseo on laaja rakennus, jossa on paljon kerroksia ja eri tiloja. Museota ympäröivät rakennustelineet ovat myös sokkeloisia. Siksi onkin hyvä harjoitella rakennuksesta poistumista hätätilanteiden varalta. Evakuointiharjoituksessa tarkastettiin työmaan palohälytysjärjestelmän toimivuus, sekä henkilöstön oikeanlainen toiminta harjoituksen aikana. Poistuminen rakennuksista tapahtui hyvässä järjestyksessä ja koko henkilöstö löysi kokoontumispaikalle, jossa tarkastettiin ettei kukaan ollut jäänyt rakennukseen.

Aamupäivän aikana työmaalla päästiin tutustumaan myös Hiltin työturvallisuuteen liittyvään kalustoon. Esittelyssä oli mukana mm. keinotekoisia, ulkoisia tukirankoja, jotka puetaan päälle keventämään fyysistä työtä.



Kuva 7. Poistumisharjoituksen jälkeen kokoontumispaikalla.

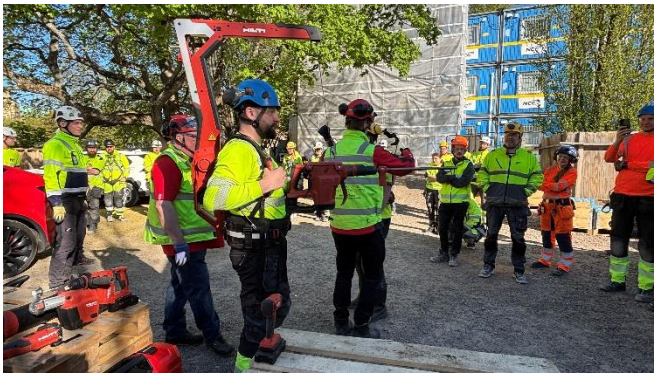

Kuva 8. Tukirankojen toimivuuden kokeilua.



Kuva 9. Hyväksi havaittu apuväline.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232 lomalla viikko 24. Työmaasta vastaa Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi 010 507 8451.

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki
