


Viikkotiedote 39/2026

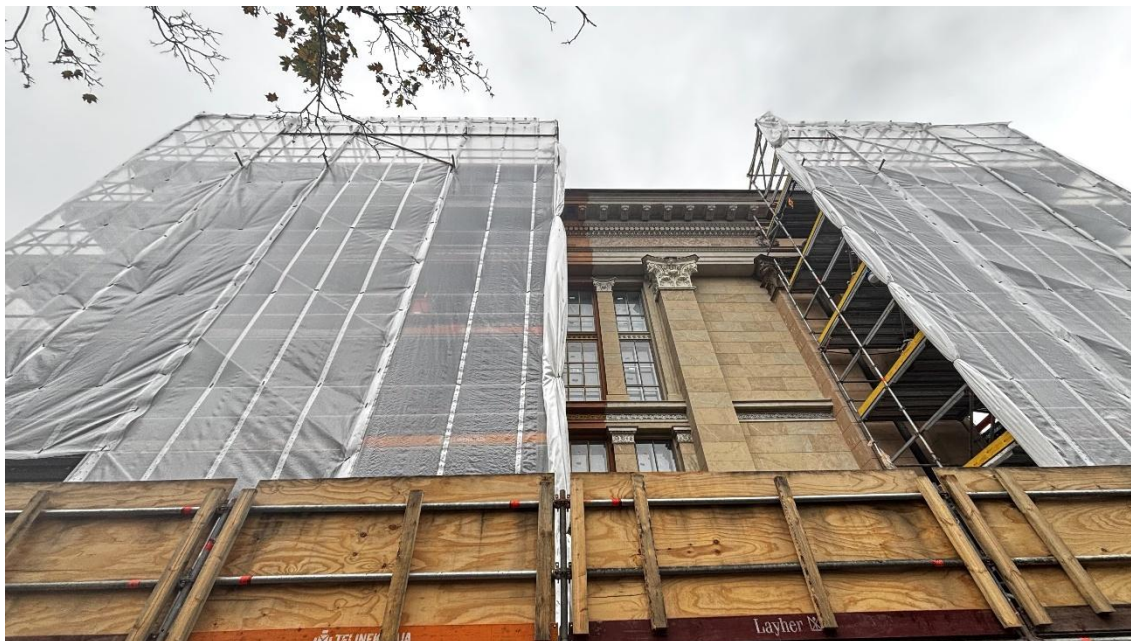

Kansallisarkiston vanhat julkisivut vaativat kunnostusta. Julkisivukorjauksia tehdään Kansallisarkiston vuonna 1890 valmistuneessa päärakennuksessa, vanhassa tutkijasalissa, niiden välisessä yhdysosassa sekä vuonna 1928 valmistuneessa B-makasiinissa.

Nämä julkisivut on korjattu edellisen kerran laajamittaisesti 1980-luvun alussa. Nyt ne kunnostetaan perusteellisesti osana käynnissä olevaa peruskorjausta. Julkisivuista poistetaan vanhat maalipinnat, korjataan rappaus-, sokkeli- ja betonivauriot sekä kunnostetaan ikkunat, pellitykset, sadevesijärjestelmä ja julkisivukoristeet. Lopuksi julkisivut maalataan kauttaaltaan rakennuksen historiallista ilmettä kunnioittaen. Kaikista keskeisistä työvaiheista tehdään mallityöt ennen varsinaisten korjaustöiden toteuttamista.

Purkutyöt etenevät vauhdilla sääsuojan sisällä, ja ensi viikolla päästään aloittamaan julkisivujen rappauksia. Vanhan päärakennuksen julkisivuille halutaan palauttaa alkuperäinen väri. Tätä varten rakennuksen länsipäättyyn on tehty koko julkisivun korkuinen maalausmalli. Ensimmäiset värimallit toteutettiin levyalustoille, joiden perusteella valittiin julkisivuun testattavat sävyt. Mallialueella kokeillaan sekä

työmenetelmiä että väri vaihtoehtoja ennen varsinaisten korjaustöiden aloitusta. Mallialueen telineet on poistettu katselmuksen ajaksi, jotta Museovirasto, suunnittelijat ja rakennuttaja voivat arvioida ja hyväksyä julkisivun lopullisen värityksen. Lopullinen mallikatselmus vanhan päärakennuksen länsijulkisivulla pidetään viikolla 40.



Kuva 1. Länsijulkisivu ennen töiden aloitusta.




Kuva 2. Levymalleja.



Kuva 3. Mallialuetta.



Kuva 4. Kipsikoristeiden maalausmalli.

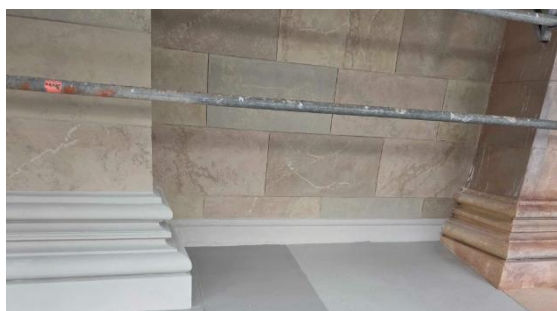

Kuva 5. Harkkokuvion maalausmalli.



Kuva 6. Seinän ja koristeiden maalausmalli.



Kuva 7. Balusterin maalausmalli.



Kuva 8. Maalausmallia maalaamassa.

Tiedotusvälillä tapahtunut ja käynnissä olevat työvaiheet

- talotekniikkareittien varmistaminen ja rakennus
- lämmitysjärjestelmien väliaikaiset asennukset
- timanttityöt ja läpiviennit
- mallihuoneiden rakennus- ja viimeistely
- sisäpuolen purkutyöt ja ryöstötilan maamassojen imurointi
- alapohjien rakentaminen
- hissikuilujen purku
- IV-konehuoneiden rakennustöiden valmistelu
- talotekniikkakuilujen ja nousureittien valmistelu
- lämmitysjärjestelmän rakentaminen ja työmaaolosuhteiden hallinta
- ikkunoiden kunnostus
- julkisivun purkutyöt ja haalausaukkojen avaukset
- julkisivun kipsikoristeiden irrotus
- julkisivujen lämmitysjärjestelmien asennus valmis
- julkisivun rappaus- ja maalausmallit
- julkisivun kunnostustyöt
- vesikattotyöt
- konservointi
- tiivistystyöt
- betonirakennetyöt

Lisätietoja:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>

