

Viikkotiedote 37/2026



Awarenes day

Kansallisarkiston peruskorjaustyömaalla vietettiin NCC:n Awareness day -työturvallisuuspäivää, jonka teemana oli tänä vuonna "En koskaan tingi turvallisuudesta – työskentelen turvallisesti tai en ollenkaan". Päivän aikana työmaan työt keskeytettiin hetkeksi ja henkilöstö kokoontui keskustelemaan turvallisista toimintatavoista, riskien ennakkoinnista sekä työn huolellisen suunnittelun merkityksestä. Awareness day tukee NCC:n pitkäjänteistä turvallisuustyötä ja vahvistaa työmaiden turvallisuuskulttuuria.

Työmaalla työturvallisuus on korkealla tasolla. Työntekijöitä palkittiin pizzalla, kun työmaa tavoitti ensimmäiset 100 päivää ilman työtapaturmia ja ulkoisen TR-mittauksen tulos ylitti 99,30 %. TR-mittari on suomalainen menetelmä, jolla arvioidaan ja seurataan talonrakennustyömaan työturvallisuutta ja työolosuhteita.



Kuva 1. Työntekijät työturvallisuuspäivän palaverissa.



Kuva 2. Pizzaperjantai työntekijöiden tilassa.

Tiedotusvälillä tapahtunut ja käynnissä olevat työvaiheet

- talotekniikkareittien varmistaminen ja rakennus
- lämmitysjärjestelmien väliaikaiset asennukset
- timanttityöt ja läpiviennit
- mallihuoneiden rakennus- ja viimeistely
- sisäpuolen purkutyöt ja ryöstötilan maamassojen imurointi
- hissikuilujen purku
- IV-konehuoneiden rakennustöiden valmistelu
- talotekniikkakuilujen ja nousureittien valmistelu tuleville LVIA- ja sähköasennuksille
- lämmitysjärjestelmän rakentaminen ja työmaaolosuhteiden hallinta
- ikkunoiden kunnostus
- julkisivun purkutyöt ja haalausaukkojen avaukset
- julkisivun kipsikoristeiden irrotus
- julkisivujen lämmitysjärjestelmien asennus
- julkisivun rappaus- ja maalausmallit
- julkisivutelineiden varustelu valmis
- uuden tutkijasalin vesikattotyöt
- konservointi
- tiivistystyöt

Alkavat työvaiheet

- vesikattotyöt
- julkisivurappaus





Kuva 3. Vanha tutkijasali ennen peruskorjauksen aloitusta.

Vanhan tutkijasalin arvokkaan


kattopinnan konservointi on aloitettu

huolellisten valmisteluvaiheiden jälkeen.

Ennen työn käynnistymistä tiloissa toteutettiin tarvittavat suojaukset, purkutyöt sekä kattava alkudokumentointi.

Katon puhdistusta varten tutkijasaliin on rakennettu koko tilan kattava telinetaso, joka mahdollistaa konservoijien turvallisen ja ergonomisen työskentelyn korkealla sijaitsevien kattopintojen läheisyydessä.

Työskentely yläpuolisilla pinnoilla edellyttää erityisjärjestelyjä, joille on laadittu oma työ- ja turvallisuussuunnitelma.

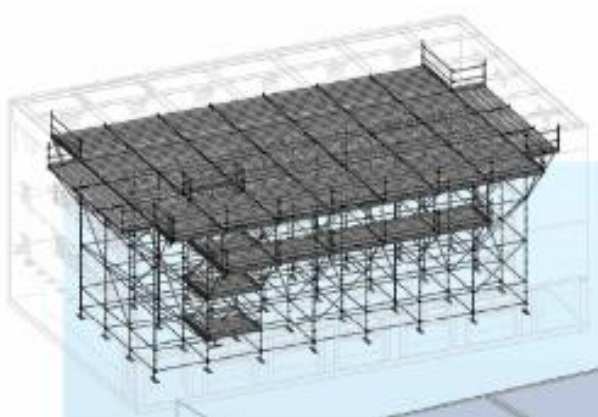

Kuva 4. Vanhan tutkijasalin tasoteline.



Kuva 5. Tasoteline vaneroitiin konservaattoreita varten.

Vanhan tutkijasalin konservointityön erityispiirteet on huomioitu myös työturvallisuudessa. Työ tehdään erittäin lähellä konservoitavia pintoja, minkä vuoksi konservaattoreille on myönnetty mahdollisuus käyttää tavanomaista kevennetympiä suojaruosteita työtä tehdessä. Ratkaisulla vältetään esimerkiksi kypärien aiheuttamat kolhut herkille kattopinnoille. Lisäksi työssä käytettävät tarkentavat suurennuslaitteet asettavat omat vaatimuksensa henkilönsuojainten käytölle.

Konservointityössä kiinnitetään erityistä huomiota tilan olosuhteisiin. Vanhassa tutkijasalissa seurataan ja tarkastetaan tilojen kosteutta, ilmanvaihtoa, valaistusolosuhteita sekä pölypitoisuutta. Olosuhteiden tulee säilyä mahdollisimman vakaina, eikä ilma saa kuivua liikaa. Pöly- ja olosuhdeseurantaa toteutetaan mittauslaitteilla ja loggereilla. Vanhan tutkijasalin katon puhdistustyössä käytetään valaistusta, joka vastaa mahdollisimman hyvin luonnollista päivänvaloa.



Kuva 6. Konservattori työssään.



Kuva 7. Puhdistettuja kattomaalauksia.



Kuva 8. Kattojen yllä, näkymä itään.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>
