

Viikkotiedote 5–6



Tiedotusvälillä tapahtunut

- Halkopihan tasotelineen purku
- telinepurku Virastosiiven itäpuolella
- metalliporttien kunnostus pajalla
- puuporttikunnostus verstaalla
- ulko-ovi kunnostus
- lasikonservointi
- LVI-asennukset, toimivuuden varmistus, lämmitysverkoston mittaus ja säätö, palopeltieristystä
- sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen ja käyttöönotto
- rakennusautomaation toimivuuden varmistus
- valvojien kierrokset käynnissä
- loppusiivous
- opasteiden asennus
- Vaunuvajan seinien kuivatus


Halkopihalta poistettiin tasotelineet viikolla 5. Seuraavaksi alueella aloitetaan betoniportaiden muottien rakentaminen ja portaiden valutyöt. Näiden jälkeen viimeisenä merkittävänä työvaiheena toteutetaan Halkopihan graniittilattian rakentaminen.



Kuva 1. Halkopihan lasikaton teräsrakenne.



Kuva 2. Kansantieteellisen osan itäseinä Halkopihalle päin.

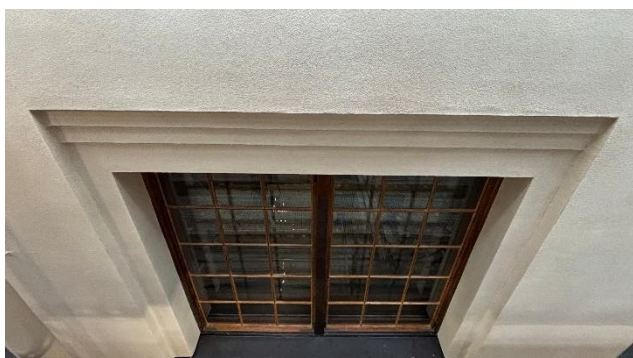

Kuva 3. Akustorappausta ja ikkuna-asennuksia Halkopihalla.




Kuva 4. Halkopihan lasikatto.



Kuva 5. Akustorappausta Halkopihalla.



Kuva 6. Valaisinasennuksia Halkopihalla.

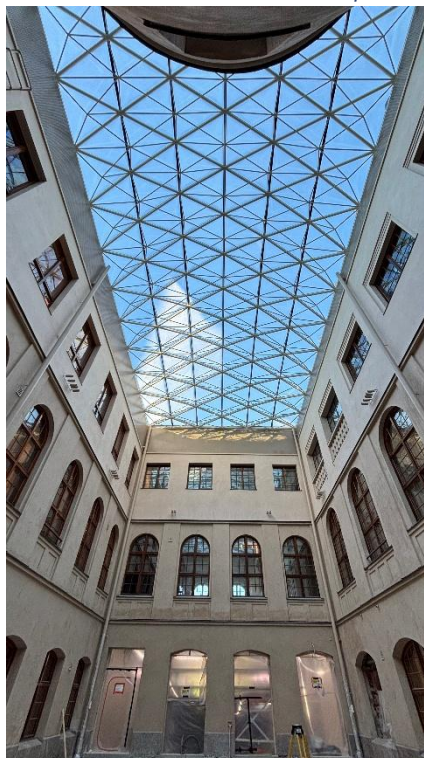

Kuva 7. Halkopiha telineiden purun jälkeen.



Kuva 8–9. Työturvallisuudesta vastaavaa tiimiä ja ilmakuva Kansallismuseosta.
[instagram.com@ncc_fi/Kansallismuseo](https://www.instagram.com/ncc_fi/Kansallismuseo).

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa osallistui vuoden **2025 valtakunnalliseen talonrakentamisen työturvallisuuskilpailuun ja sijoittui hienosti toiseksi**. Kilpailussa vertaillaan työmaiden työturvallisuutta TR- mittauksien perusteella. Kansallismuseon peruskorjaustyömaan TR-indeksitulos kisassa oli huikeat 99,45 % ja voittajalla vain neljä sadasosaa parempi tulos.

Kilpailu oli historiallisen tasainen, ja tulokset kertovat rakennusalan turvallisuustyön merkittävästä kehityksestä. Kansallismuseon peruskorjaushanke on vaativa, suojeltu korjauskohde, jossa turvallisuus on korostunut jokapäiväisessä tekemisessä alusta lähtien. Laajat purkutyöt, monimutkaiset telineratkaisut ja historiallinen ympäristö tekevät turvallisuuden varmistamisesta erityisen tärkeää.



Kuva 10. Aleksi esittelemässä työmaata vierailijoille.

Aluevastaava **Aleksi Ropponen** on työskennellyt NCC:llä korjausrakentamisen parissa jo 14 vuoden ajan. Korkealla työskentely ja keskeinen sijainti ovat vaatineet hyvää työtehtävien ennakkosuunnittelua ja yhteensovittamista ympäristön kanssa.

Näissä vaativissa tehtävissä on onnistuttu erinomaisesti. Hyvin suunniteltuna työt on helppo toteuttaa ja työturvallisuudestakin tulee arkipäivää.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki
